

## Bestellvorlage System WABU 4 (TUT 45)

Kunde: \_\_\_\_\_ Kom.: \_\_\_\_\_ Raum Nr.: \_\_\_\_\_

Best.Nr.: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Termin: \_\_\_\_\_



Maß A: \_\_\_\_\_ mm **Zargenfalzmaß in der Höhe** + \_\_\_\_\_ mm Bodeneinstand

Maß B: \_\_\_\_\_ mm **Zargenfalzmaß in der Breite**


Ohne Sockel  60 mm Sockelhöhe  80 mm Sockelhöhe

DIN L  DIN R

**Aufmaß:** Zu klären ist, wo die OK fertiger Fußboden später liegt (Meterriss). Am Meterriss orientieren sich alle Höhen. Zu klären ist, wie die Fußbodenleisten zur Alu-Zarge liegen, bzw. flächenbündig integriert werden (Sockelleistenausklinkung) denn nur dann macht das System Sinn. Planen Sie mindestens zwei Aufmaßstermine und zwei Montagestermine ein (1. Aufmaß - Rohzarge, Montage der Rohzarge, 2. Aufmaß der Türmaße und dann die Türenfertigmontage). Türstärken stumpf mit Falz (53 mm, 57 mm) sind mit diesem System möglich. Wir empfehlen dringend mit allen beteiligten Gewerken die Ausführung zu besprechen und alle Montagearbeiten aller Gewerke sorgfältig und genau vorzunehmen.

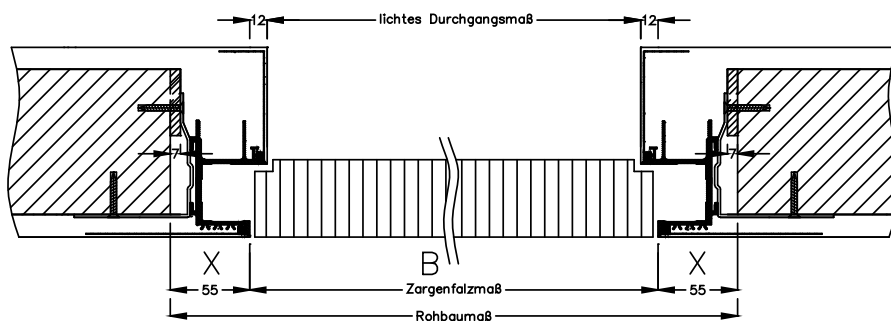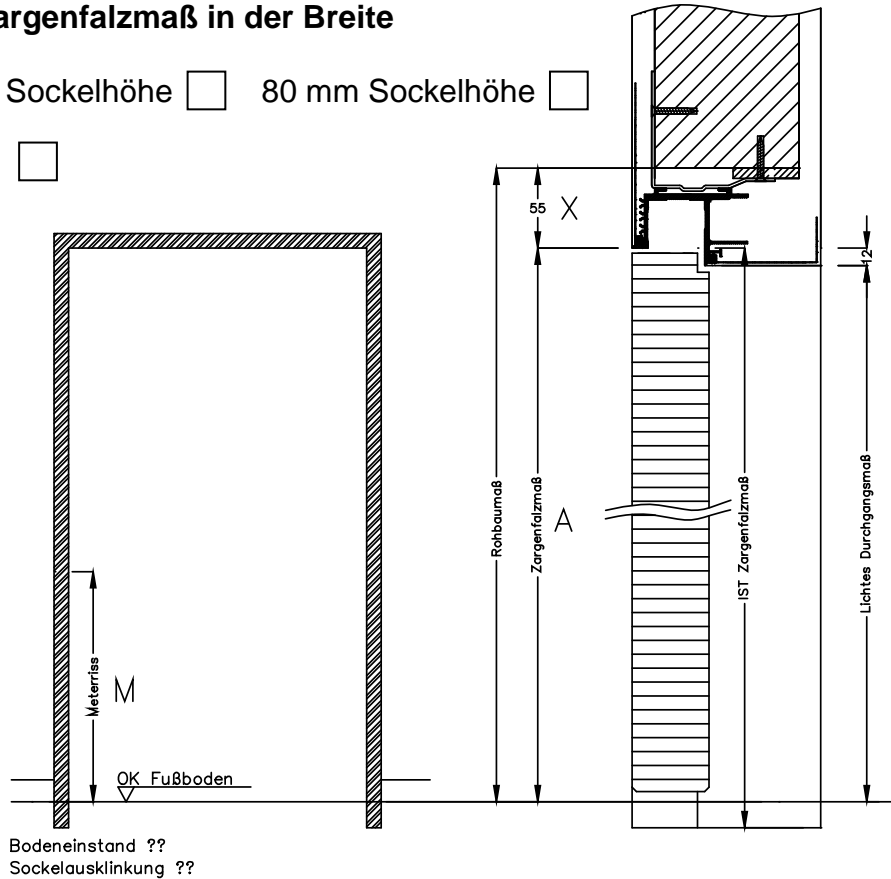

TB nach außen öffnend



DIN-Richtungen
